

基礎配筋検査報告書

実施日	2012年10月09日		総合判定 適合
登録物件名	XXXX XXXX XXXX	Y1396703	
事業者名	株式会社 フォレストサイド	A0301406	
事業者立会者	XXXX XXXX XXXX		
報告者	XXXX XXXX XXXX		

【凡例】「方法」欄 A:目視確認 B:計測確認 C:書類確認(設計図書含む)

「判定」欄 ○:適 ×:不適 -:該当なし 保留:判定保留

※目視・計測可能な部位で確認し、保険の適否を判定します。

1. 書類


No.	項目	方法	判定
1-1	基礎配筋検査用の必要書類	C	○
【備考】1-1. 基礎伏図、断面図、確認			

2. 基礎

No.	項目	方法	判定
2-1	べた基礎の鉄筋径および配筋間隔	A B C	○
2-2	布基礎の鉄筋径および配筋間隔	A B C	-
2-3	布基礎の底盤幅	A B C	-
2-4	深基礎の鉄筋径および配筋間隔	A B C	-
2-5	出隅・入隅、T字型、+字型、直線の各部分の配筋状況	A B C	○
2-6	基礎立上り部 欠き込み補強筋状況	A B C	-
2-7	かぶり厚さ 60mm 以上(ベース配筋またはスラブ配筋の下端)	B C	○
【備考】			

特記事項

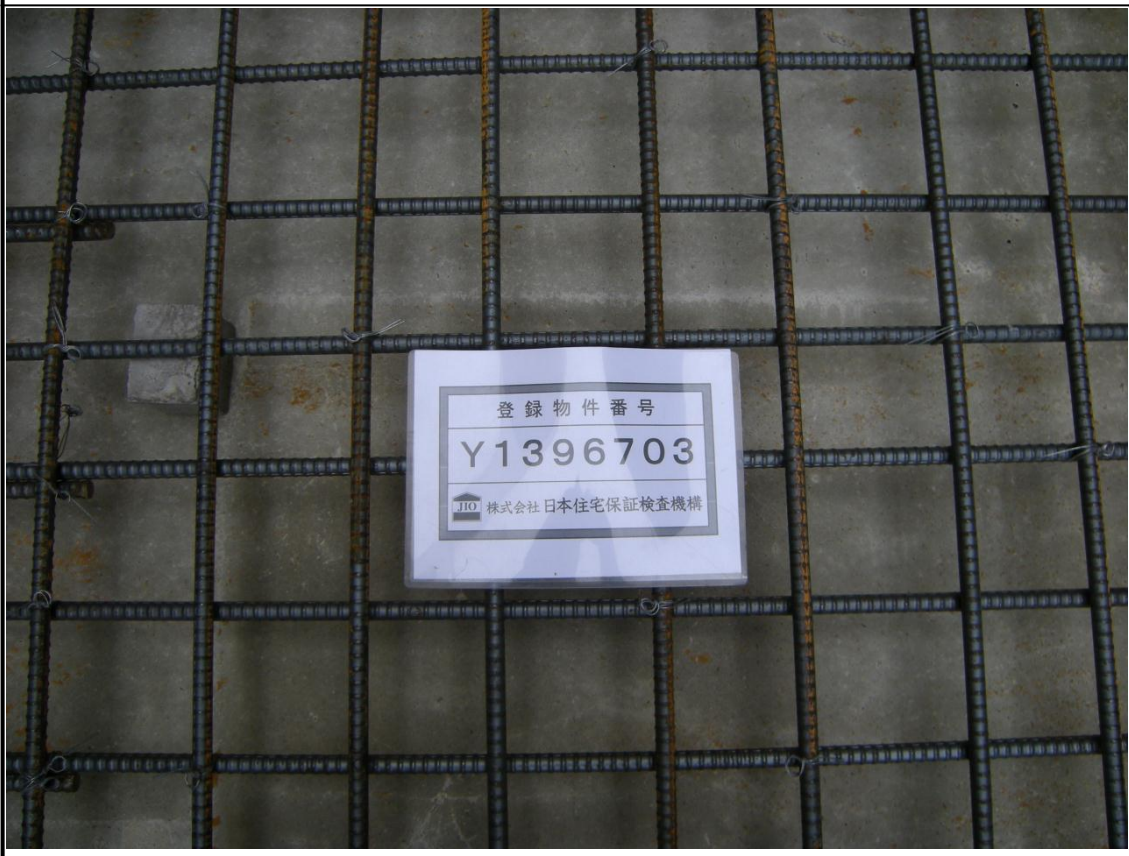
--

全景写真	備考
	

外周部基礎立上がり部分	備考
	

Y1396703

出隅部分の状況	備考
	

スラブ配筋の状況	備考
	

Y1396703
